

Ansökan ställd av :
 ÖREBRO KOMMUN,
 ÖREBRO LÄNS LANDSTING,
 LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO,
 ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT
 STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO

PROJEKTANSÖKAN TILL
 SAMORDNINGSFÖRBUNDET
 FINSAM I ÖREBRO

PROJEKTPLAN

Datum: 2009-03-09

Projektbenämning

LÖSA-implementering

Projektledare och projektägare

De samverkande myndigheterna äger, leder och styr projektet via styrgruppen (se under organisation).

Mats Wickholm , arbetskonsulent på Activa är projektledare under implementeringsfasen

Intressenter

Stiftelsen Activa gör arbetsförmågebedömning samt arbetsprövning för deltagarna. Under implementeringsfasen finns möjlighet att ta emot 12 personer som anvisas från beredningsgruppen.

Under implemeteringen ska frågan om hur Activa ekonomiskt ska kompenseras för insatsen lösas i ett långt perspektiv. Activa har både samverkansavtal och tjänsteköpsavtal med Örebro kommun så det bedöms lämpligt att undersöka möjligheten att lösa frågan om tjänsteköp den vägen. När det gäller personer som anvisas från de övriga huvudmännen ska finansieringsfrågan lösas under projekttiden.

Bakgrund

Activa har i samverkan med Örebro kommun, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med finansiering från Allmänna arvsfonden under tre år drivit ett projekt kallat för LÖSA. Målgruppen var personer med ADHD-diagnos, boende i Örebro län. Projektets huvudsyften var att

- (a) Ge personer med ADHD ett individuellt utformat stöd via Activamodellen för de skulle få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden samt
- (b) Utarbeta en metod för ett generellt samverkande stöd för gruppen med ADHD.

18 personer med ADHD-diagnos deltog i projektet. Samtliga deltagare var aktuella hos fler än en av de samverkande myndigheterna. Få deltagare hade fullgjort gymnasieutbildning och flertalet hade en mycket begränsad

arbetserfarenhet. De flesta hade ett tidigare missbruk. Vid projektets slut befanns sig hälften i arbete eller utbildning, av de resterande 9 personerna hade 3 fortsatt stöd från Activa i syfte att nå ett arbete, 6 personer bedömdes inte stå till arbetsmarknadens förfogande.

LÖSA-projektet har utvärderats samhällsekonomiskt av extern utvärderare, arbetslivsresurs AR AB. Totalt för samhället innebar projektet en årlig positiv effekt på 1,5 miljoner kronor för de 18 individer som deltog.

En lärdom från projektet är att man bör ge de representanter som utses att verka i en samverkansordning kring rehabilitering, mandat att fatta beslut om de individer som samverkan rör. Det kan till gälla beslut om t ex vårdinsatser eller bistånd/rådgivning som rör den sociala sfären, problem rörande familjsituationen eller den egna ekonomin. Då inte dessa befogenheter fanns till fullo hos representanterna i LÖSA-projektets bedömningsgrupp medförde det tidsförluster då ärenden i stället för att lösas i den upprättade samverkansordningen måste föras inåt i organisationen för förankring, dels att deltagarna i projektet missgynnades då besluten som rörde dem hamnade på en nivå där avståndet blev så långt att deras aktuella behov också försvann ur sikte.

En annan viktig erfarenhet att bygga vidare på, var samarbetet med Attention och projektanställningen av den lokale Attentionordföranden. Denne har själv erfarenhet av att leva med diagnosen ADHD och kunde komplettera det mer formellt inriktade arbetet i projektet genom att visa på strategier för handlande i olika situationer då deltagarna annars kunde agera på ett för dem själva och omgivningen, destruktivt sätt. Han kunde ge råd till projektdeltagarna om hur de bör tänka och göra för att få någon form av kontroll över sitt liv, som stundtals gränsade till det kaotiska. Han hade regelbunden kontakt med dem under hela projektiden, även utanför ordinarie arbetstid. Activa ser detta som en bra metod för att skapa en brygga mellan det mer informella och ideella samt det mer formella och myndighetsinriktade. Under implementeringen ska utredas hur deltagare ska kunna erbjudas budget- och skuldrådgivning under tiden som arbetsförmågan prövas. Dessutom ska möjligheten till en personlig kontaktperson undersökas. Kontaktperson som fyller den funktion som Attentionordföranden gjort i LÖSA-projektet.

Psykiatrin i länet blev en viktig samverkanspart under LÖSA-projektet. I den framtida organisationen är det väsentligt att samverkan med psykiatrin organiseras så att kontakt nås på ett enkelt och snabbt sätt. Enligt landstinget, kan p g a omorganisering av den psykiatriska vården, ett sådant samarbete påbörjas tidigast i september 2009.

Syfte

Syftet med LÖSA-implementering är att för personer med ADHD-diagnos i Örebro kommun, använda sig av de positiva erfarenheter man gjort under projektiden med LÖSA. Vidare att hitta vägar för att tillföra det som det tidigare projektet funnit att målgruppen har behov av och åtgärda de organisatoriska brister man erfarit.

Arbets sättet, metoderna, samverkan och fördelning av kostnader, ska sedan implementeras till ordinarie verksamhet alternativt kan uppdraget finnas kvar hos Activa som är en reell samverkan mellan myndigheterna sedan tjugo år.

Det som bedöms vara det ekonomiska och verksamhetsmässiga mest effektiva arbetssättet, ska prioriteras.

Mål

Målet är att till den 31 december 2009, inom ordinarie verksamheter, ha en fungerande arbetsrehabilitering och ett samordnat adekvat långvarigt stöd för vuxna personer bosatta i Örebro kommun, som har en ADHD- diagnos.

Organisation


Projektet styrs av en styrgrupp bestående av en representant vardera från samverkande myndighet. Representanterna ska ha mandat från sin linjeorganisation, att fatta beslut.

Vid styrgruppens möten deltar Finsam som samverkans- och processstöd. Projektledare och Activa deltar för att kunna lyfta fram frågor som aktualiseras i projektet och som styrgruppen behöver besluta och hållas underrättade om. Vid behov kan även andra delta vid möten, t ex Attention.

Remiss för potentiell deltagare skickas från samverkande myndighet, efter den enskildes medgivande, till en urvalsgrupp – bedömningsgrupp bestående av handläggare från myndigheterna samt Activa. Med remissen följer eventuella utredningar och underlag till diagnos.

Beskrivning av den individuella processen.

Insatser för vuxna med ADHD och sammansatt problematik i första hand personer yngre än 40 år. Insatser från minst 2 myndigheter.

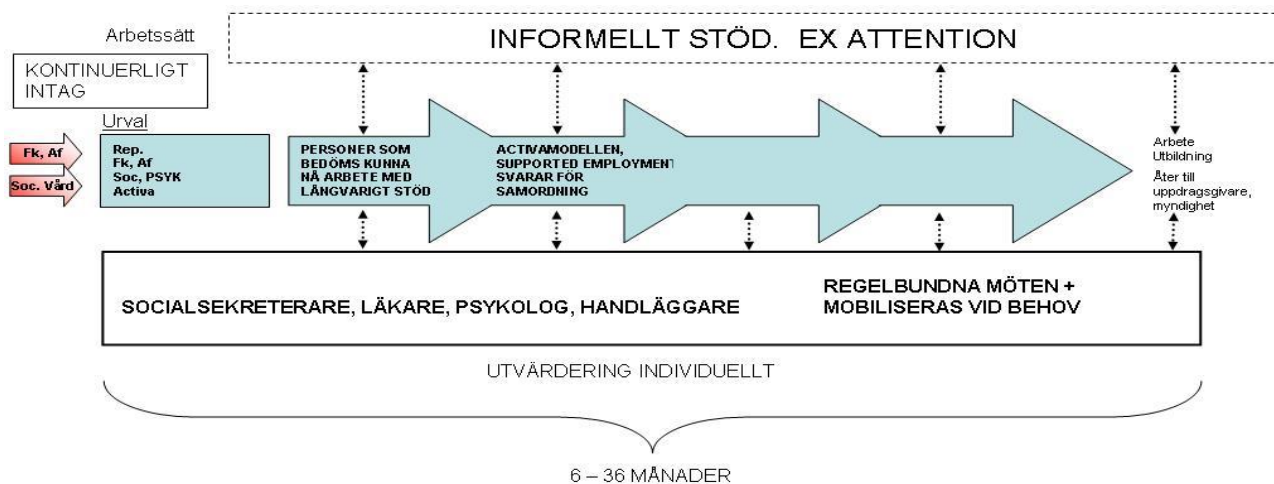

Tid & aktivitetsplan

Vid beviljad finansiering av Finsam i mars 2009, kan implementeringsprojektet fas 1 starta f o m 2009-07-01 för att pågå fram till 2009-12-31.

Fas 1. Praktiska frågor ordnas, personal anställs, deltagare tas in och insatser påbörjas

Fas 2. Arbetet med deltagare fortsätter under tiden som konkret implementering pågår fram till 2010-12-31
Deltagarna avslutar inte sin rehabilitering utan den fortsätter som en del av ordinarie verksamhet. Intagning fortsätter.

Planerad budget

Activa
1,0 tjänst arbetskonsulent
0,20 tjänst projektledare
0,1 tjänst arbetsplatsanskaffning
0,3 tjänst informellt stöd

Befattning	lön/månad	lönebikostnad	Adm	omfattning	totalt
			mm kostnad		
Arbetskonsulent	26 500	42%	13%	100%	246 450
Projektledare	27 500	42%	13%	20%	51 150
Arbetsplatsanskaffare	26 500	42%	13%	10%	24 645
Informellt stöd	23 500	42%	13%	30%	65 565
			SUMMA		387 810

I den administrativa kostnaden mm ingår

	<i>Kvantitet</i>	<i>Kr, per månad</i>	<i>Kr, 6 månader</i>
Lokaler inkl städ	2	1 600	19 200
Resor	250 km	750	4 500
Administration	5 %	941	5 650
Kommunikation	x 2	600	7 200
Utbildning, personalvård	x 2	500	6 000
Övrigt			7 865
Summa			50 415

Uppföljning

Projektledare ansvarar att leverera underlag för registrering i SUS och följer upp enligt den av Finsam tillämpade självvärderingsmodellen. Finsam och projektledare analyserar och sammanfattar uppföljningarna tillsammans.

Utvärdering

Någon utvärdering ska inte göras. En samhällsekonomisk utvärdering har genomförts av LÖSA. För att följa upp och kontrollera måluppfyllelse med LÖSA-implementering, är uppföljning och en analys och sammanfattning, tillräcklig.

Örebro mars 2009

Underskrifter

.....
Örebro kommun namnförtydligande

.....
Stiftelsen Activa, Örebro namnförtydligande

.....
Försäkringskassan namnförtydligande

.....
Örebro läns landsting namnförtydligande

.....
Arbetsförmedlingen namnförtydligande
